

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

DELEGATION REGIONALE DE
L'EXTRÊME-NORD

SOUS-DIRECTION REGIONALE
DES ROUTES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace- Work - Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

FART NORTH REGIONAL
DELEGATION

REGIONAL SUB DEPARTMENT
OF ROADS

IA2
N°REF 75/B/MINTP/DR-EN/DR20

AI2
Maroua, le 17 MAI 2023

À

MONSIEUR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

(A l'Attention de Monsieur le Directeur de l'Entretien et de la
Protection du Patrimoine Routiers)-

YAOUNDE-

BORDEREAU RECAPITULATIF DES PIECES ADRESSEES

Numéro d'ordre Serial Number	<u>SOMMAIRE</u> DESCRIPTION	NOMBRE	<u>OBSERVATIONS</u> Remarks
1	<u>Marché</u> : N°228/M/MINTP/CIPM-TERI/2020 Pour l'exécution des travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel de la route régionale R0906 Zamay-Camp des réfugiés de Minawao (09,70) km dans la Région de l'Extrême-Nord <u>Titulaire</u> : KIAMA SA BP 15709 Yaoundé <u>Financement</u> : BIP MINTP <u>Exercices</u> : 2020 2021 et 2022		Pour suite de la procédure de paiement
	Décompte provisoire n°7 des travaux exécutés à la date du 31/08/2022 d'un montant TTC de 53 975 900 F CFA	09 (1 original + 08 copies)	
	TOTAL	09	

Arrêté le présent bordereau à : **Neuf (09) pièces.**

Reçu (received) à (In) Le (The) 2023



LE DELEGUE REGIONAL

Alko'a Remy Elindé
Ingénieur Principal ONICC 16-1924
Assermenté T.O.C

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

DELEGATION REGIONALE DE
L'EXTRÊME-NORDSOUS-DIRECTION REGIONALE
DES ROUTES**REPUBLIC OF CAMEROON**

Peace- Work - Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

FART NORTH REGIONAL
DELEGATIONREGIONAL SUB DEPARTMENT
OF ROADS

IA2

N° 000 7 / BT/MINTP/DR_EN/DR20

À

AI2

Maroua, le 17 MAI 2023

MONSIEUR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS(A l'Attention de Monsieur le Directeur de l'Entretien et de la Protection du
Patrimoine Routiers)-YAOUNDE-**BORDEREAU RECAPITULATIF DES PIECES ADRESSEES**

Numéro d'ordre Serial Number	<u>SOMMAIRE</u> DESCRIPTION	NOMBRE	<u>OBSERVATIONS</u> Remarks
1	<u>Marché</u> : N°228/M/MINTP/CIPM-TERI/2020 Pour l'exécution des travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel de la route régionale R0906 Zamay-Camp des réfugiés de Minawao (09,70) km dans la Région de l'Extrême-Nord <u>Titulaire</u> : KIAMA SA BP 15709 Yaoundé <u>Financement</u> : BIP MINTP <u>Exercices</u> : 2020 2021 et 2022		Pour suite de la procédure de paiement
	Décompte provisoire n°7 des travaux exécutés à la date du 31/08/2022 d'un montant TTC de 53 975 900 F CFA	09 (1 original + 08 copies)	
	TOTAL	09	

Arrêté le présent bordereau à : Neuf (09) pièces.

Reçu (received) à (In) Le (The) 2023

Ampliations:

- SDRR
- MDC
- Entreprise
- Chrono/Arch

LE DELEGUE REGIONAL

Remy Claude
Ingénieur Principal ONIGC 16-1924
Assementé T.G.C

Marché N° 288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020

BIP 2020

Travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel de la route Zamay-Camp des réfugiés de Minawao 9,70 km dans la région de l'extrême nord

21 mai 2021

DIPAS

Page n°1

DECOMPTE PROVISoire N° 7
DES TRAVAUX EXECUTES A LA DATE DU:

31/08/2022

31/08/2022													
Numéro		Designation des prix	Unité	Prix Unitaire	QUANTITES			MONTANTS H. taxes (Fcia)				% réalisé	
Ordre	Prix				MARCHE	CALAGE	REALISEES Cumul Préced. du Mois	Marché (modios)	Marché (Calage)	Cumul précéd.	du Mois		Cumul du mois
SERIE 000:INTALLATIONS													
1	TM 001	Installation de chantier	ft	10 000 000	1,0	1,0	0,80		10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	80,00%
2	TM 002	Amené et rempli du materiel	ft	5 000 000	1,0	1,0	0,5		5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	50,00%
SERIE 100: TERRASSEMENT													
3	TM 104	Déblai ordinaire mis en dépôt	m³	2 800	1 920,0	3 514,0	1407		5 376 000	9 839 200	3 939 600	3 939 600	46,04%
4	TM 108	Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m³	2 800	18 673,0	24 118,6	9546,97		52 284 400	67 532 080	26 731 510	26 731 510	39,58%
5	TM 110	Mise en forme de la plate forme	m2	200	58 200,0	68 682,0	51355		11 640 000	13 736 400	10 271 000	10 271 000	74,77%
SERIE 200 CHAUSSEE													
6	TM 213	Imprégnation sablée	m2	800	74 690,0	68 600,0			59 752 000	54 880 000			
7	TM 214	Enduit superficiels bicouche	m2	3400	74 690,0	68 600,0			253 946 000	233 240 000			
SERIE 400 : OUVRAGE D'ART													
8	TM 401	Dalot en béton armé 2,0m x 1,0m	ml	1 000 000	56,0	60,0	58,22	18	56 000 000	60 000 000	58 220 000	58 220 000	127,03%
9	TM 423	Béton dos à 350kg/m3	m3	180 000	30,0	29,5	26,56	2,95	5 400 000	5 313 600	4 781 689	5 312 988	98,98%
SERIE 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE													
10	TM 516	Panneaux de signalisation métallique de type A	u	150 000	5,0	4,0			750 000	600 000			
TOTAL HTVA													
HTVA													
Montant TTC													




DECOMPTÉ PROVISOIRE N° 7 A
DES TRAVAUX EXECUTES A LA DATE DU: 31/08/2022

Montant marché: 480 148 400 F CFA
Avenant
Montant Total 548 718 476
Présent décompte (Cumul)
Décompte Antérieur (Cumul)
Acompte à délivrer

Eléments positifs		Eléments négatifs		Total des paiements
Avance de démarrage	Prestations AIR incluse	Remboursement de garantie d'Avance	Pénalités de retard	
29 290 080	132 975 088			162 265 178
29 290 080	87 712 289	cautionné		117 002 369
	45 262 809	cautionné		45 262 809
Montant net de l'acompte à mandater (paiements - AIR)				44 267 027 Fcfa

Arrêté le présent décompte à la somme de:

Quarante Quatre Millions Deux Cent Sixante Sept Mille Vingt Sept Francs CFA

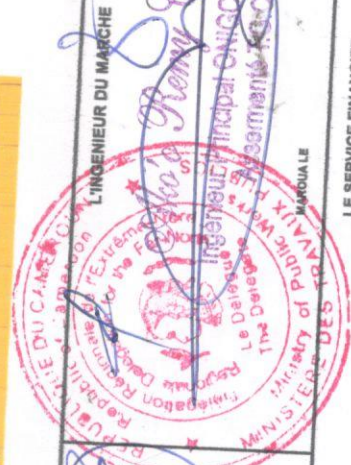

LE CHEF SERVICE DU MARCHÉ

LE SERVICE FINANCIER

YACOUDE LE

YACOUDE LE



Taxes (Fcf)	
AIR	TVA
3 569 834	31 236 047
2 574 052	22 522 856
895 782	8 713 091

DECOMPTÉ PROVISOIRE ! 7 B/ AIR et TVA

DES TRAVAUX EXECUTES A LA DATE DU:

31/08/2022

MINISTRE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
FCFA 0001500
TIMBRE FISCAL-FISCAL STAMP
CMR20068

Eléments positifs		Eléments négatifs		Pénalités de retard	Total des paiements
Avance de démarrage	Prestations	Retenue	Rembours		
29 290 080	132 975 098	132 975 098	cautionné	182 265 178	
29 290 080	87 712 289	87 712 289	cautionné	117 002 369	
	45 282 809	45 282 809	cautionné	45 282 809	

Taxes (Fcf)	
AIR	TVA
3 569 834	31 236 047
2 574 052	22 822 866
995 782	8 713 091

995 782	8 713 091
---------	-----------

Arrêté le présent décompte des taxes à la somme de:

Neuf Cent Quatre Vingt Quinze Mille Sept Cent Quatre Vingt Deux Francs CFA
Huit Millions Sept Cent Treize Mille Quatre Vingt Onze Francs CFA

AIR 995 782
TVA 8 713 091
Fcfa
Fcfa

 LE CHEF SERVICE DU MARCHÉ	 MAÎTRE D'ŒUVRE	 INGÉNIEUR DU GÉNIE CIVIL MAÎTRE EN GESTION DES PROJETS	 INGÉNIEUR DU MARCHÉ
YAOUNDE LE	YAOUNDE LE	YAOUNDE LE	YAOUNDE LE

Attachement n° 7 / TM 108a
des travaux exécutés à la date du : 31/08/2022

Unité m³

[illegible]

le maître d'œuvre



Sando Toichou



A handwritten signature in blue ink is written over a circular red stamp. The stamp contains the text "N. & Commerce Company Ltd." around a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

MBESSO SAÏDOU
INGÉNIEUR DU GÉNIE CIVIL
MAÎTRISE EN GESTION DES PROJETS

Marché N° 288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020

N° Prix TM 401b
 Désignation Dalot en béton armé 2,0m x 1,0m
 Unité ml

Attachement n° 7 / TM 401b
des travaux exécutés à la date du : 31/08/2022

n°	Localisation des travaux					n°	Quantité		Quantités		
Ordre	Désignation de l'ouvrage					mètre ou	estimée	Avanc	Cumulées	du mois	Cumulées
	PK	LONG.				Attach aux.		%	précédentes		du mois
1	0+452	7					7	100%	7,000		7,0
2	0+530	7					7	100%	7,000		7,0
3	0+780	7					7	100%	7,000		7,0
4	2+540	7					7	100%	7,000		7,0
5	2+680	7					7			6,0	6,0
6	3+100	7					7			6,0	6,0
7	3+250	8,85					8,85	100%	8,850		8,85
8	3+853	8,85					8,85	100%	8,850		8,85
9	6+501	7					7	100%	7,000		7,0
10	7+266	6,9					6,9	80%	5,520		5,5
11	8+100	7					7			6,0	6,0
Total									58,220	18,00	76,22

pour l'Entreprise



[Handwritten signature]

Sanda Coukour

le maître d'œuvre



[Handwritten signature]

MBESSO SAÏDOU
 INGÉNIEUR DU GÉNIE CIVIL
 MAÎTRISE EN GESTION DES PROJETS

Marché N° 288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020

N° Prix	TM 423c
Désignation	Béton dos à 350kg/m3
Unité	m3

Attachement n° 7 / TM 423c
des travaux exécutés à la date du : 31/08/2022

n°	Localisation des travaux Designation de l'ouvrage						m ³	Quantité	Avanc	Quantités		Cumulées
Ordre							mètre ou Attach aux.	estimée	%	précédentes	du mois	Cumulées du mois
	PK		LONG	LARG	EPAIS							
	1+387		17,8	4,3	0,2			15,31	100%	13,78	1,5	15,31
	7+929		13,93	5,1	0,2			14,21	100%	12,79	1,4	14,21
Total										26,56	2,95	29,5

pour l'Entreprise

le maître d'œuvre



Sanda Coukou



MBESSO SAÏDOU
INGÉNIEUR DU GÉNIE CIVIL
MAÎTRISE EN GESTION DES PROJETS

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE ZAMAY-CAMP DES REFUGIES de MINAWAO

MARCHE: N°288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020
Titulaire: KIAMA SA B.P. 15709 YAOUNDE
Maitre d'Œuvre: DIPAS B.P. 35634 YAOUNDE

Constat N° 07 des Travaux Exécutés au 31/08/2022

prix n° TM 108a remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt

unité: m3

PK début	PK Fin	Long (m)	Larg (m)	EP	QTE	OBSERVATION
0+00	0+082	82,00	8,00	0,225	147,600	En cours
0+082	4+00	3 878,00	6,80	0,17	4 482,968	En cours
4+00	4+900	900,00	6,80	0,35	2 142,000	En cours
4+900	7+500	2 400,00	6,80	0,17	2 774,400	En cours
TOTAL					9 546,968	

Prix n° TM 401b DALOT EN BETON ARME 2m x 1m

Unité: ml

PK début	PK Fin	Long (m)	Larg (m)	COTE	QTE	OBSERVATION
2+680	2+680	6,00	2,00	-	6,000	En cours
3+100	3+100	6,00	2,00	-	6,000	En cours
8+100	8+100	5,00	2,00	-	6,000	En cours
TOTAL					18,000	

Prix n° TM 423c BETON dosé à 350 kg/m3


Unité: m3

PK début	PK Fin	Long (m)	Larg (m)	EP	QTE	OBSERVATION
1+387	1+404,8	3,43	4,30	0,2	2,95	En cours
TOTAL					2,95	

Pour l'Entreprise



Pour le Maître d'Œuvre



MBESSO SAÏDOU
INGÉNIEUR DU GÉNIE CIVIL
MAÎTRISE EN GESTION DES PROJETS
